

MEETING PRESENCE					
PLACE:	STABILIMENTO OFF.MA		DATE:	25/02/2026	
Fincantieri Infrastructure	☐ A. Mason	☒ M. Melotto	☐	☐	☐
Off.ma S.p.A.	☒ S. Zadro	☒ E. Boccalon	☐	☐	☐

No.	DESCRIPTION	ACTION		CLOSURE DATE
1.0	GENERALE			
1.1	Situazione 160060 (PO29DX): Ciclo LD: Ciclo LD terminato e completamente spedito. Ciclo LE: Ciclo LE terminato e completamente spedito. Ciclo LF: Terminate le fasi di assemblaggio e saldatura. Controlli Phased Array positivi, in attesa verniciatura delle travi 60LFT0001 e 60LFT0005. Ciclo LG: Terminata fase di assemblaggio e saldatura. Gli elementi risultano in fase di controllo CND e pronti per successiva fase di sabbatura e verniciatura. Ciclo LH: Terminata fase di assemblaggio e saldatura. Gli elementi risultano in fase di controllo CND e pronti per successiva fase di sabbatura e verniciatura. Controlli Phased Array positivi, in attesa verniciatura delle travi 60LHT0001 e 60LHT0005. Ciclo LI: Materiale in fase avanzata di produzione (100% tagliato, 95% assemblato e 80% saldato) presso lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro; Ciclo LJ Materiale in fase avanzata di produzione (100% tagliato, 100% assemblato e 40% saldato) presso lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro; Ciclo LK: Tutto il materiale è stato interamente tagliato (100%) presso lo stabilimento di Martignacco e in corso di trasferimento presso lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro (95%). (INVARIATO) Piastre sciolte: Le piastre sciolte dei vari cicli di produzione risultano completamente tagliate. Per i cicli di produzione LD, LE e LF le piastre risultano spedite.	-----	-	-----

	Prosegue la fase di verniciatura per i cicli LG e LH. I restanti cicli risultano termianti in attesa di sabbiatura e verniciatura.			
2.0	MONTE E ALLUNGHI TAGLI / GESTIONE PRE-SALDATURA			
2.1	Materiale preassemblato Il materiale visionato risulta in gran parte già preassemblato e in fase avanzata di vestizione e saldatura. In preparazione al momento della visita ispettiva le seguenti marche: Ciclo LK:  <i>Materiale base ciclo LK.</i>	----	—	----
3.0	GESTIONE DEL MAGAZZINO E TAGLIO			
3.1	Materiale base per ciclo LG, LH, LI, LJ e LK: Tutto il materiale base risulta stoccato internamente in modo ordinato.  <i>Materiale base LK.</i>	----	—	----



Materiale base LK.



HEB700 per marca 60LKD0002.

STEEL PREPARATION:

Fase di finitura cianfrini:



3.2



4.0 ASSEMBLAGGIO, SALDATURA, SABBIATURA E VERNICIATURA

ASSEMBLAGGIO E SALDATURA

Ciclo LF:

Marca 60LFT0001:

Controlli phased array positivi, in preparazione per sabbiatura:



Marca 60LFT0005

Controlli phased array positivi, in preparazione per sabbiatura:



Ciclo LG:

Marca 60LGT0002

Terminata fase T-Master



Ciclo LH:

4.1

Marca 60LHD0002:
Pronte per sabbiatura:



Marche 60LHT0001:
Controllo Phased Array positivo, pronta per sabbiatura:



Marche 60LHT0002:
Pronta per CND:



Marche 60LHT0003:
Pronta per piolatura:




Marche 60LHT0004:
Pronta per CND:



Marche 60LHT0005:

Controllo Phased Array positivo, pronta per sabbiatura:

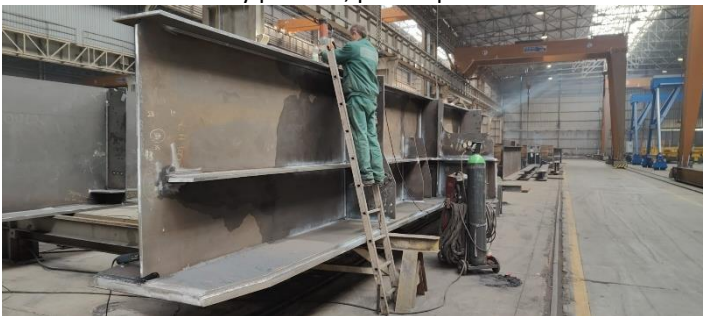

Ciclo LI:

Marche 60LIT0001:

Pronta per CND:



Marca 60LIT0002:

Pronta per sabbiatura:



Marca 60LIT0003:

Pronta per CND:



Marche 60LIT0004, 60LIT0021 e 60LIT0023:
Pronte per sabbiatura:



Marca 60LIT0005:
Conclusa fase T-master, in vestizione:



Marca 60LIT0006:
Pronta per piolatura:



Marca 60LIT0007:
Pronta per piolatura:



Marca 60LIT0008:
Pronta per piolatura:



Marca 60LIT0009:
Pronta per piolatura:



Marca 60LIT0010:
Pronta per piolatura:




Marca 60LIT0011:
Pronta per CND:



Marca 60LIT0012:

In saldatura manuale:

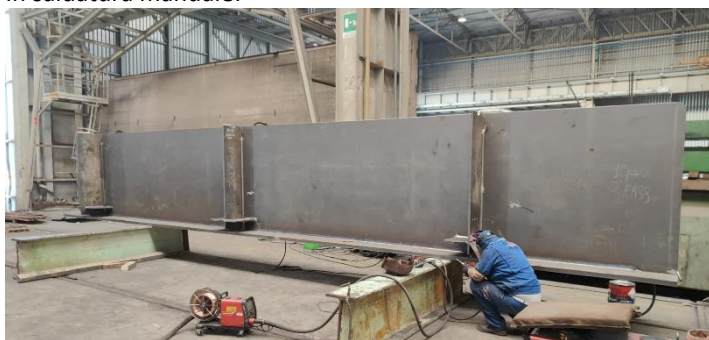

Marca 60LIT0013:

Pronta per piolatura:



Marca 60LIT0014:

In saldatura manuale:



Marca 60LIT0015:

In saldatura manuale:



Marche 60LIT0016 e 60LIT0017:

Pronte per piolatura:



Marca 60LIT0018:

In saldatura manuale:



Marca 60LIT0019:

Pronta per piolatura:



Ciclo LJ:

Marca 60LJD0001:

In saldatura:



Marca 60LJD0002:

In saldatura:



Marca 60LJD0003:

Pronta per CND:



Marca 60LJT0001:

Conclusa fase T-master, in vestizione:



Marca 60LJT0003:

In saldatura manuale:



Marca 60LJT0004:

In vestizione:



Marca 60LJT0005:

Conclusa fase T-master, in vestizione:



SABBIATURA:

Attualmente risultano in cabina di sabbiatura le seguenti marche:

**Marca 60LGT0015;
Marca 60LGT0018;
Marca 60LGT0019;
Marca 60LGT0020;**

4.2

-

				
4.3	VERNICIATURA: Durante la visita ispettiva, risultano in fase di verniciatura i seguenti elementi (Primer applicato): Marca 60LIT0020 Marca 60LIT0022 Marca 60LIT0024 Marca 60LIT0025  <i>Marche 60LIT0020 e 60LIT0025.</i>  <i>Marche 60LIT0022 e 60LIT0024.</i>	----	—	----
4.4	CONTROLLO DIMENSIONALE: Durante la visita ispettiva sono stati effettuati dei rilievi su di una delle componenti saldate, controllate da Traterm e già soggetta a controllo dimensionale da parte del Sig. Boccalon Emanuele.	----	—	----

Marca esaminata 60LIT0003. (Trave inferiore)

In particolare sono state misurate le tolleranze in accordo al prospetto B.1 della UNI EN 1090-2:

- Profondità (quota a disegno 1762mm), rilevato in campo 1764mm ($\Delta=2$) (In tolleranza);
- Larghezza flangia superiore (quota a disegno 400mm) rilevato in campo 399mm ($\Delta=1$) (In tolleranza);
- Larghezza flangia inferiore (quota a disegno 1000mm) rilevato in campo 998mm ($\Delta=2$) (In tolleranza);
- Eccentricità del setto superiore (quota a disegno 191 mm); rilevato in campo dx 190mm ($\Delta=1$) (In tolleranza) sx 191mm (In tolleranza);
- Eccentricità del setto inferiore (quota a disegno 291 mm); rilevato in campo dx 290mm ($\Delta=1$) (In tolleranza) sx 291mm (In tolleranza);
- Planarità superiore/inferiori regolari;
- Ortogonalità superiore/inferiore regolari.



Misurazione profondità.



Misurazione flangia superiore.



Misurazione flangia inferiore.



Misurazione eccentricità setto superiore dx.



Misurazione eccentricità setto superiore sx.



Misurazione eccentricità setto inferiore dx.



Misurazione eccentricità setto inferiore sx.



Planarità flangia superiore.




Planarità flangia inferiore.



Ortogonalità superiore.



Ortogonalità inferiore.

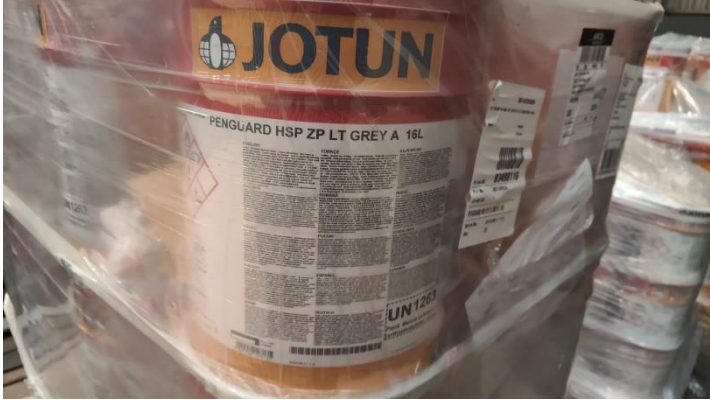4.5	MARCATURA: (Invariato) Per garantire la tracciabilità, oltre alla marcatura su ciascun pezzo, viene applicata pre-fase di verniciatura una targhetta riportante marca del pezzo e riferimento del progetto; 	-----	-	-----
4.6	MATERIALE D'APPORTO: Si conferma l'utilizzo di idoneo materiale d'apporto ESAB, secondo specifiche FI; (Invariato) Anche la vernice risulta stoccata adeguatamente:  	-----	-	-----
5.0	STOCCAGGIO ELEMENTI STRUTTURALI PRONTI PER LA SPEDIZIONE			

Risultano pronti alla spedizione i seguenti elementi strutturali:

Marca 60LGT0002
Marca 60LGT0003
Marca 60LGT0004
Marca 60LGT0005
Marca 60LGT0007
Marca 60LGT0022
Marca 60LGT0023
Marca 60LGT0025



Marche 60LGT0005 e 60LGT0007.

5.1



Marche 60LGT0002 e 60LGT0025.



Marche 60LGT0004, 60LGT0003, 60LGT0022 e 60LGT0023.

Risultano già spedite le seguenti marche:

Ciclo LD:
 Completamente spedito.

	Ciclo LE: Completamente spedito. Ciclo LF: 60LFT0001; (29/01/2026) 60LFT0003; (29/01/2026) 60LFD0003; (06/02/2026) 60LFT0002; (12/02/2026) 60LFT0004; (13/02/2026) Ciclo LG: 60LGT0008; (16/02/2026) 60LGT0009; (16/02/2026) 60LGT0010; (17/02/2026) 60LGT0011; (17/02/2026) 60LGT0024; (18/02/2026) 60LGT0001; (20/02/2026) 60LGT0006; (20/02/2026) 60LGT0012; (23/02/2026) 60LGT0013; (23/02/2026) 60LGT0016; (20/02/2026) 60LGT0017; (24/02/2026) 60LGT0021; (24/02/2026)			
--	--	--	--	--
